

E-sirkulære BØ/2012/05

Arbeid på Filipstad 2012

Doculivenummer: 201101220

Dato: 19.03.2012

Beskrivelse:

Ombygging av KL-anlegg på Filipstad er i gang, og ombygging skal foregå i 3 etapper.

Fase 1; spor 9 og 10

Fase 2; spor 11

Fase 3; spor 12


Fase 1 hadde oppstart natt til lørdag 17/3, og ny koblingsskjema vil snart bli gitt ut.

Nye koblingsskjemaer for fase 2 og 3, kommer når endringer er gjort.

I fase 3 er følgende endringer foretatt.

- SI ved veksel 906 byttes ut og det monteres en SI-bryter som legges i normalt inne.
- Forbindelse mellom spor 8 og 9 fjernes
- Z-17 bryterledning. Forbindelse fjernes fra spor 10. Ny tilkoblings etableres i spor 11. Bryterledning føres langs åk i U-isolator
- Z-12 brukes til frakobling

Informasjon:

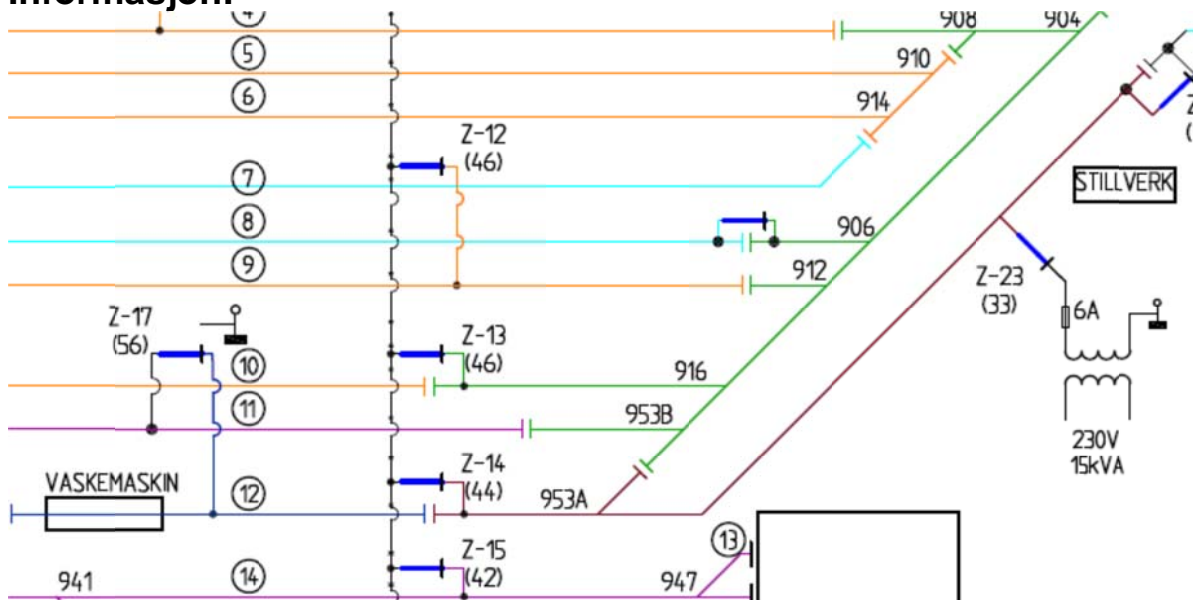

Spørsmål?

Ta kontakt med sak kyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar, e-post: akhshe@jbv.no – tele: 99 15 38 77.
