

E-sirkulære 2013-09-BØ

Doculivenummer: 201101220

Dato: 03.04.2013

Beskrivelse:

Prosjekt "Nye Høvik stasjon"


Informasjon og eventuelt tiltak:

Ibhm. prosjekt "Nye Høvik stasjon" vil vi stenge Drammenbanen på strekningen **Stabekk-Sandvika** den 7. april kl. 01:40

KL-anlegget vil bli revet i begge spor fra Høvik - til loddavspenning Stabekk, og fra Høvik - til loddavspenning ved ca. km 11.250

Etter denne dato vil situasjonen for KL-anlegget på strekningen være som vist på vedlagte bilder/tegninger.

- Bryter 14-281 og 14-282 låses i ute-stilling (Egen lås)
- Profilfri endepunktjording (skrudd til skinne) etableres i begge spor ved ca. km 13.200

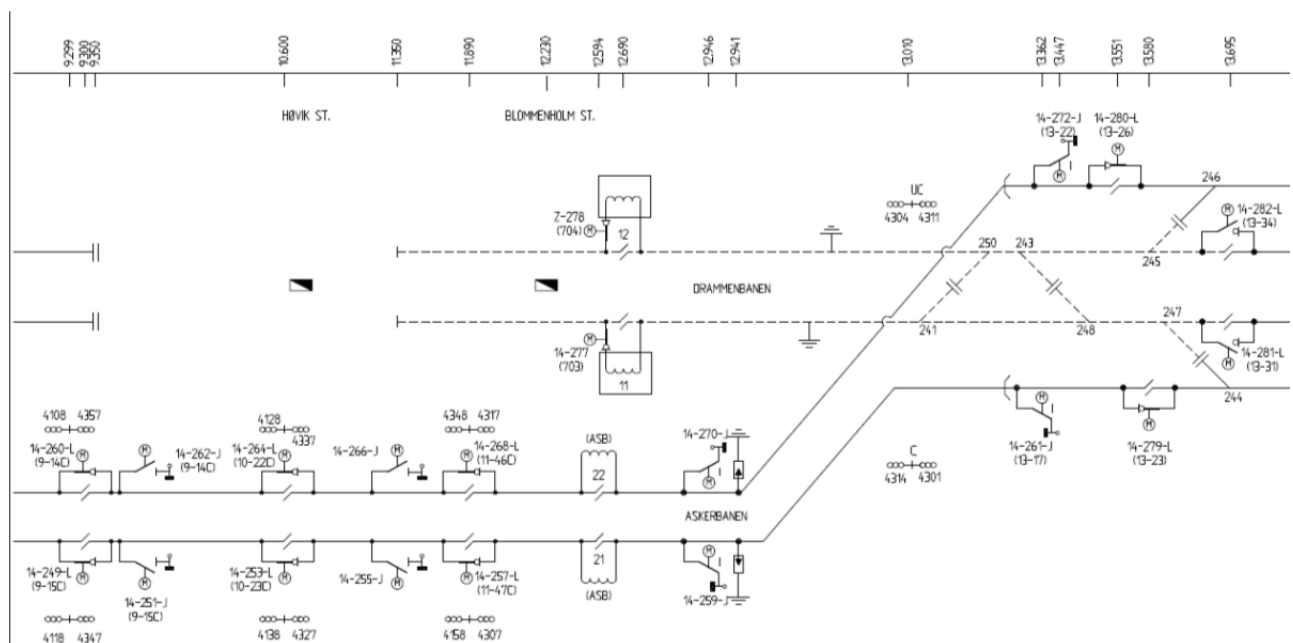

Spørsmål?

Ta kontakt med sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.
Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tlf: 99153877
