

E-sirkulære BØ/2012/19

Beskrivelse:

Varsel om endring i kontaktledningsanlegget!!!

Informasjon:

Vedlagt ligger koblingsskjema som viser situasjonen på Drammen stasjon f.o.m. 3. desember 2012.

Gangen i arbeidene frem mot 3. desember:

- 3-10. november blir det strukket KL i sporene 22, 24, 26, og 27.
- Sluttkontroll KL-anlegg, spor 22, 24, 26, og 27 er planlagt utført 14. november.

Stenging av spor 20

- 10. november spennes ledning i spor 20 midlertidig av i mast 7655, og arbeidene med spor 20 starter.
- Sluttkontroll KL-anlegg, spor 20 er planlagt utført 2-3. desember.

Åpning av spor 20, 22, 24, 26, og 27 blir 3 desember!!

Spørsmål?

Ta kontakt med sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar, e-post: akhshe@jbn.no – tele: 99 15 38 77.

Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft til personalet som jobber med EI-kraft.

EK.000130

EK.000140

MERKNADER:

- U1 Reserve
- U2 Dra-Dst
- U3 Vestfald
- U4 Drammen st.
- U5 Sundland
- U6 Dst-Dra
- U7 Gulskogen


⊕ = kabelnummer

* 16-487-S skal normalt være utkoblet

16-473-S skal være utkoblet før 16-487-S kobles inn.

Skillebryter F1 til F7 indikerer skillefunksjon som oppnås når effektbrytervogn trekkes ut.

IKKE SAMSVAR MELLOM SKAMARKEN OG SUNDHAUGEN I KABELNUMRER A KMS2245 OG UA VED KMS2085

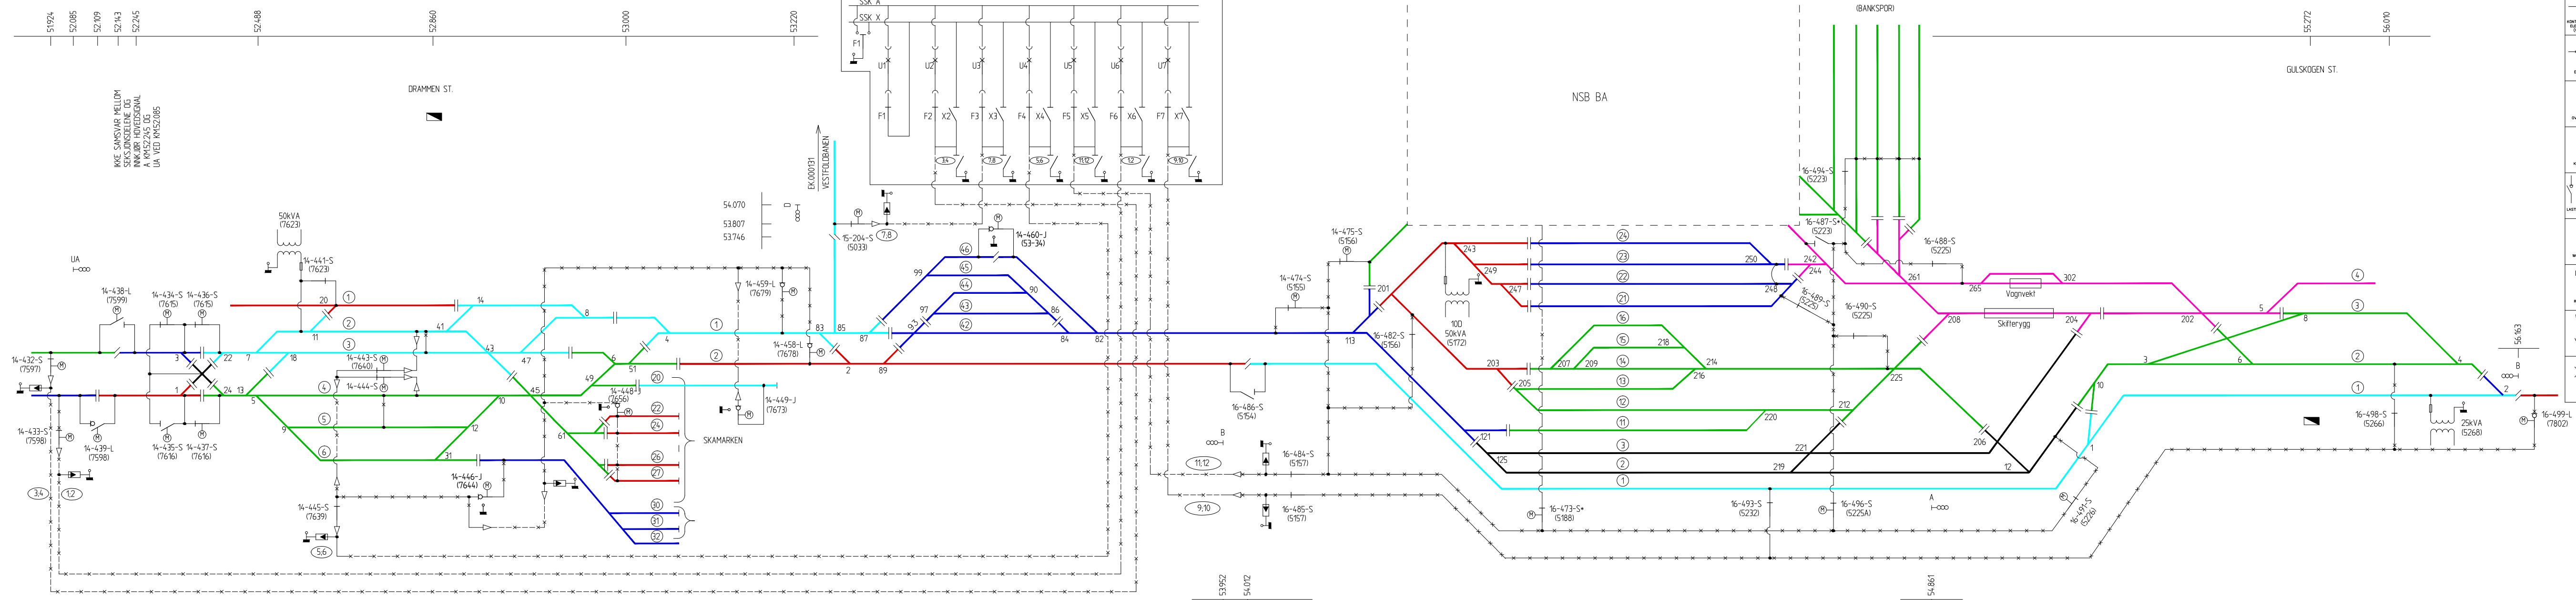

02C	Arbeidstegning	09.03.2012	xjosv	xstan	KEG
01B	Tilbudstegning	01.12.2011	xjosv	xstan	KEG
00A	Detaljplan	15.11.2011	xjosv	xstan	KEG
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Utarb. av	Kontr. av	Godkj. av

Drammenbanen (Asker) - Drammen, Drammen st.		Målestokk	
Kontaktledning		%	
Koblings skjema, nytt anlegg		Produsent	JBV Utbygging_JBT
Drammen stasjon		Prod. tegn. nr.	
		Erstatning for	
		Erstattet av	

Hensettingsprosjektet Drammen, 960252 SKAMARKEN OG SUNDHAUGEN		Tegningsnummer	IUP-00-R-00646	Revisjon	02C
		Tegningsnummer		Revisjon	

