

## E-sirkulære BØ/2012/14

### Beskrivelse:

Endinger i kontaktledningsanlegget på Drammen i fra 12.08.2012

### Informasjon:

situasjonen på Drammen stasjon vil endre seg f.o.m. 12.august 2012.

Arbeidene med å rive ledning 22, 24, og 27, blir utført i perioden 6-9 august.  
Ledning 25, 26, og 28 blir revet 10-12 august.

Oppdatert koblingskjema vil bli gitt ut tidligst mulig.

Foreløpig vedligger arbeidstegning slik situasjonen vil se ut.

### Spørsmål?


Ta kontakt med sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar, e-post: akhshe@jbn.no – tele: 99 15 38 77.


EK.000130

EK.000140

**MERKNADER**  
 U1 Reserve  
 U2 Dra-Dst  
 U3 Vestfob.  
 U4 Drammen st.  
 U5 Sundand  
 U6 Dst-Dra  
 U7 Gulsbogen  
 (7,8) = kabelnummer  
 • 16-487-S skal normalt være utkoblet  
 16-473-S skal være utkoblet før  
 16-487-S kobles inn  
 Skillebryter F1 til F7 indikerer skille-  
 funksjon som oppnås når effekt-  
 brytervogn trekkes ut.

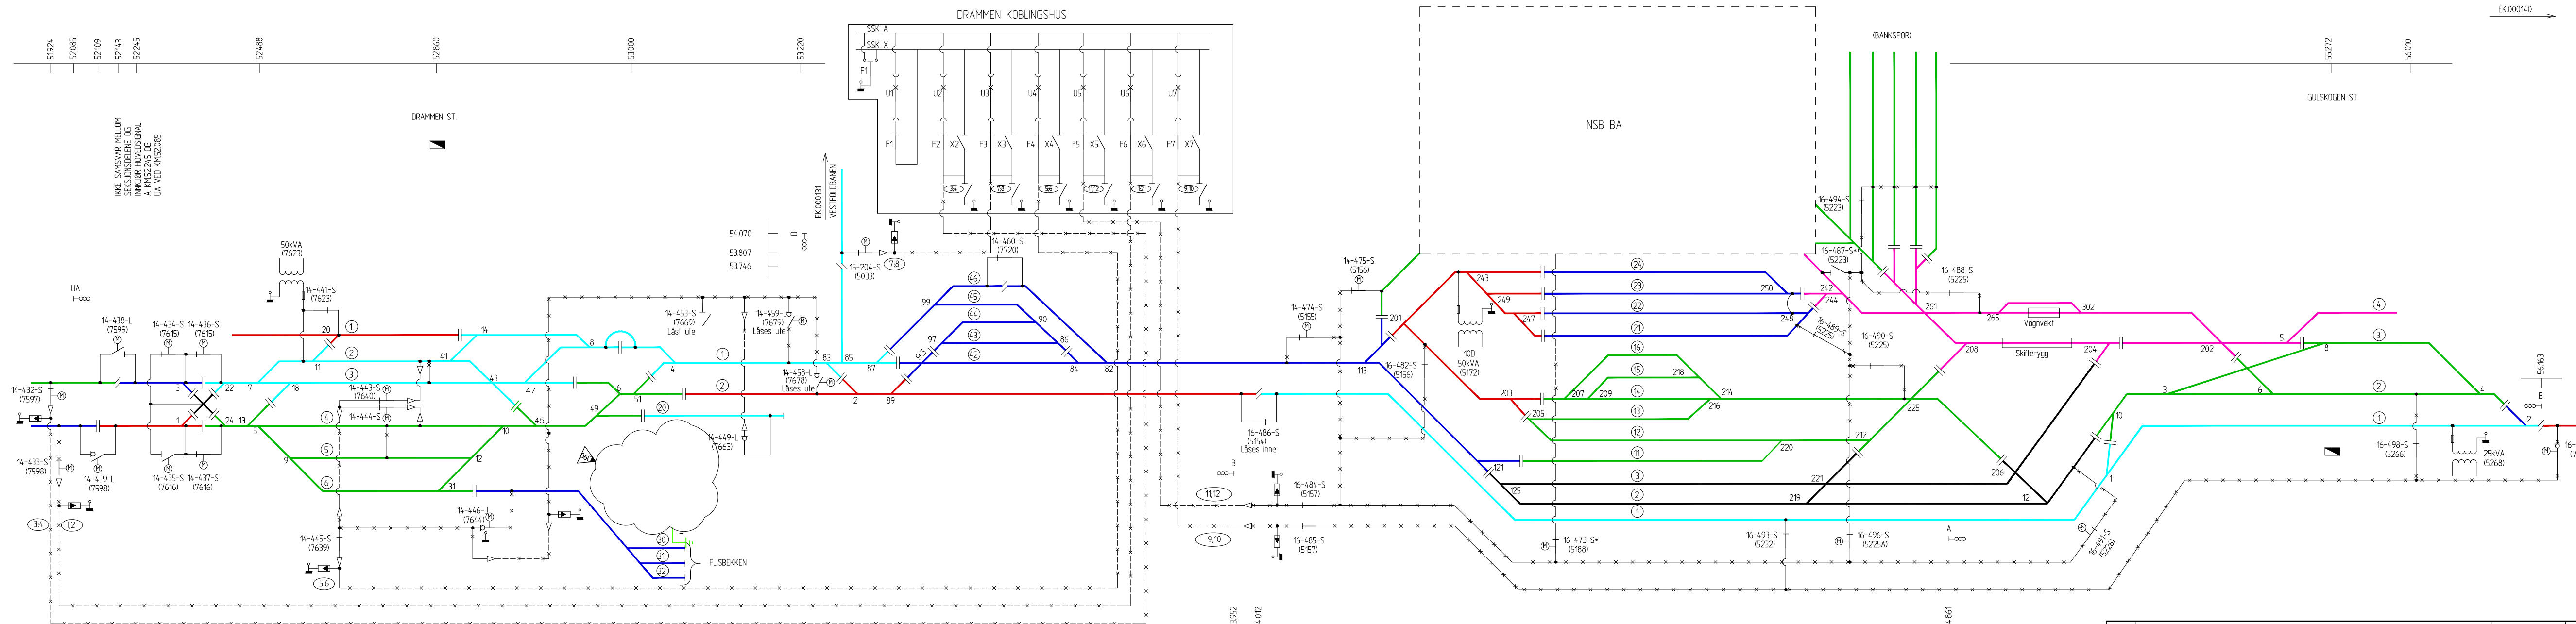

Merknader:  
 Endringene gjelder fra 12.08.2012

06C	Fjernet spor 22 - 28	03.07.2012	xjosv	xstan	KEG
05C	Lagt inn spor 30, 31 og 32 med bryter og SI	15.05.2012	xjosv	xstan	KEG
00A	Detaljplan	15.11.2011	xjosv	xstan	KEG
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Utarb. av	Kontr. av	Godkj. av
Drammenbanen (Asker) - Drammen, Drammen st.		Målestokk			
Kontaktledning		%			
Koblingsskjema, eksisterende anlegg		Produsent	JBV Utbygging_JBT		
Drammen stasjon		Prod. tegn. nr.			
		Erstatning for			
		Erstattet av			
Hensettingsprosjektet Drammen, 960252 SKAMARKEN OG SUNDHAUGEN		Tegningsnummer	IUP-00-R-00645		Revisjon 06C
 <b>Jernbaneverket</b>		Tegningsnummer			Revisjon
