

E-sirkulære 2013-12-BØ

Doculivenummer: 201101220

Dato: 25.04.2013

Beskrivelse:

Lillestrøm Hensetting


Informasjon og eventuelt tiltak:

Den 7. mai kl. 08.00 kobles kontaktledning på hensetting området ut ved at Z – 1724 legges ut og låses i ute-stilling. Nøkkel oppbevares av JBV UTB.

Kontaktledningsanlegget blir jordet ned med jordingslissee cu 95 til skinne som er definert som jordskinne. Henger profilfritt.

Den 8. mai begynner vi og ta ned kontaktledningsanlegget. Innen 20. mai så vil kontaktledningsanlegget være tatt ned.

Det skal utarbeides el planer som sendes til elkraft for godkjenning så lenge det er kontaktledning inne på hensetting.

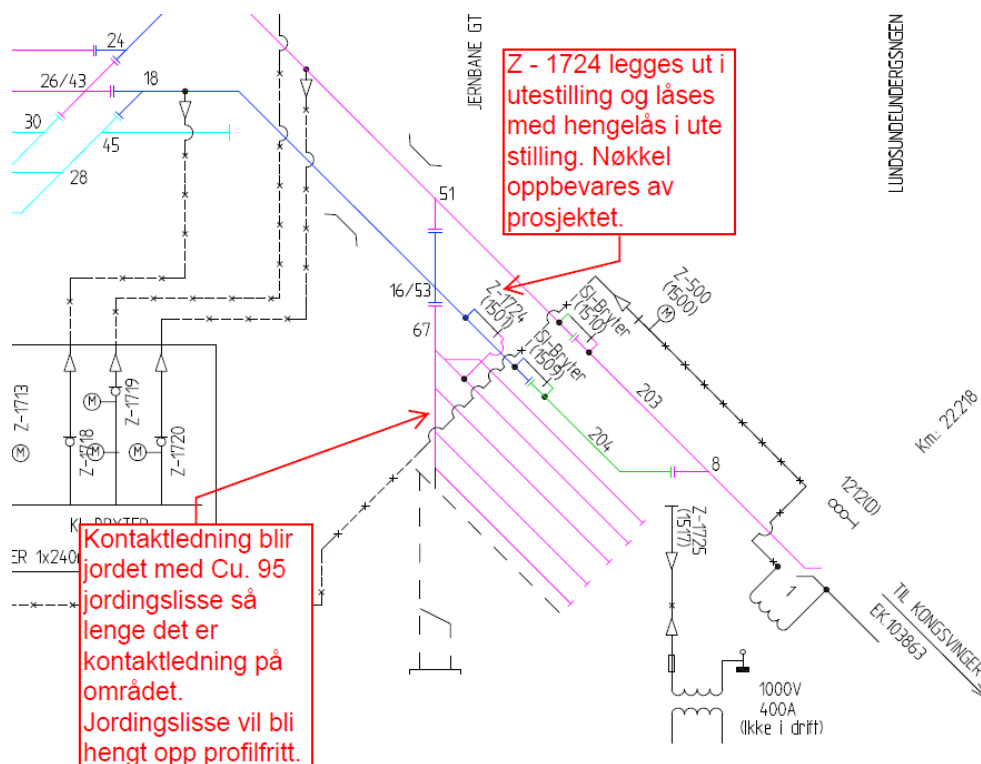

Koblingskjema for Lillestrøm [EK.103744](#)

Spørsmål?

Ta kontakt med sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tlf: 99153877
