

A night scene of a snowy mountain landscape. In the foreground, a train with several freight cars is stopped on a track. The train's headlights and interior lights are on, illuminating the snow. To the left of the train, there is a tunnel entrance with a warm glow emanating from it. The background shows steep, snow-covered mountains under a dark blue night sky with a few stars. A bright light source, possibly the moon or a star, is visible in the upper left corner.


BANE NOR

Railway Tender Conference 2019

Område Øst


Område Øst omfatter følgende banestrekninger:

- Oslo S med tilliggende områder/arealer
- Dovrebanen strekningen Eidsvoll - Fåberg
- Hovedbanen
- Gardermobanen

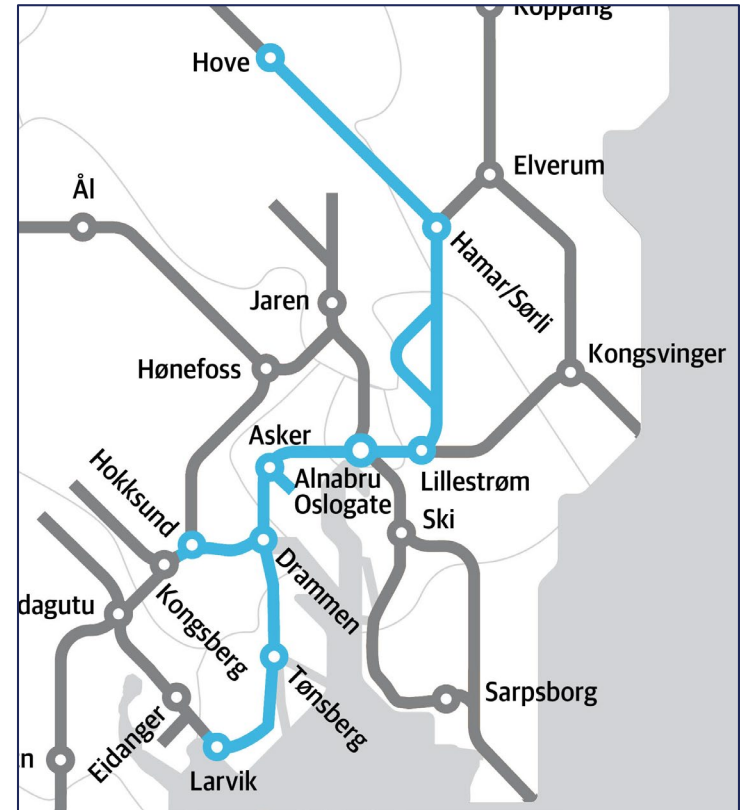

Område Øst, Prosjekter Oslo I

KONTRAKTS-OMRÅDE	BANESTREKNINGER	LENGDE (km)	HOVED-SPOR (km)	KOMMENTAR
5. Østlandet	Kongsvingerbanen , (Lillestrøm)-Riksgrensen, Solørbanen , (Kongsvinger)-(Elverum), Hovedbanen , Lillestrøm-Eidsvoll, Gardermobanen , (Oslo)-Eidsvoll	302	365	
6. Østfold	Østfoldbanen , vestre og østre linje, Vestre linje, (Oslo)-(Kornsjø), Østre linje, (Ski)-(Sarpsborg)	245	307	Follobanen inngår når den åpnes i 2022
7. Oslo	Hovedbanen , (Oslo)-(Lillestrøm), Drammensbanen , Oslo-(Drammen), Askerbanen , Lysaker-Asker, Spikkestadbanen , (Asker)-Spikkestad, Gjøvikbanen , (Oslo)-Gjøvik	252	341	Inkl. Alnabu, Alnalinja, Lodalen, Loenga og godssporet Loenga-Alnabu

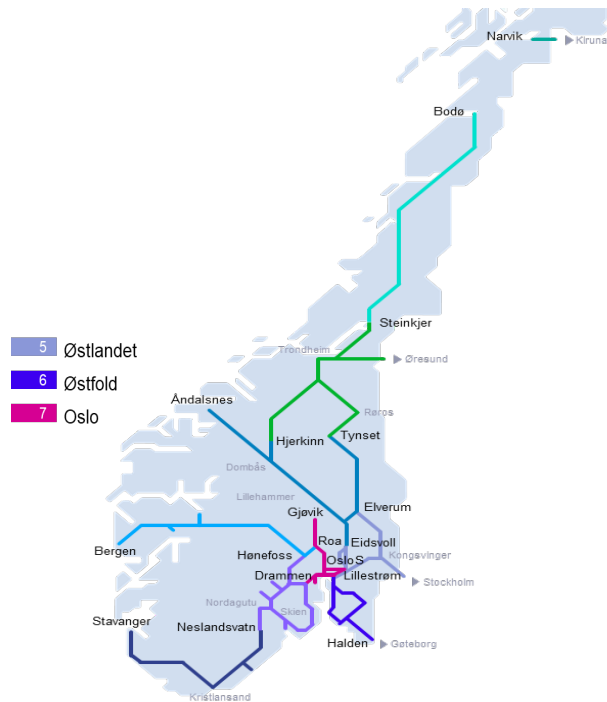

Fornyelse Gardermobanen/Hovedbanen

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Skinnebytte Gardermobanen	6000 lm slitte skinner og utvalgte parseller.	NS8406	Q1/2020	Q3/2020	Q4/2020
Masse-, Skinne- og Svillebytte Hovedbanen	Dal, Spor 1. Jessheim, Spor 3. Hauerseter.	NS8406	Q1/2020	Q3/2020	Q4/2021

Stasjoner/Plattform

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Gardermoen Stasjon, Plattform 3. Oppgradering til UU-standard.	Nytt plattformdekke. Belysning. Klimasoner. Møbleringstiltak.	NS8406	Q4/2019	Q2/2020	Q3/2020

Stabilisering Hovedbanen

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Stabilisering Hovedbanen, underbygning	Stabilisering av grunn ved Varud holdeplass Hovedbanen, spuntarbeider.	NS-8406	Q4/2019	Q2/2020	Q4/2020

Hensettingsspor til brann- og redningstog, Oslo S

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Hensettingsspor til brann- og redningstog, Oslo S	Spor- og overbygning. Takoverbygg.	NS8406	Q4/2019	Q2/2020	Q3/2020

Kontaktpersoner

Navn

Enhet

E-post

Jan Stenmark


Område Øst, Prosjektenhet 1

jan.stenmark@banenor.no

Område Øst, Prosjekter II

- Enheten har portefølje i det sentrale Oslo området, hovedsakelig på strekningen fra Oslo S – Asker – Drammen inkl. Spikkestadbanen.

KONTRAKTS-OMRÅDE	BANESTREKNINGER	LENGDE (km)	HOVED-SPOR (km)	KOMMENTAR
5. Østlandet	Kongsvingerbanen , (Lillestrøm)-Riksgrensen, Solørbanen , (Kongsvinger)-(Elverum), Hovedbanen , Lillestrøm-Eidsvoll, Gardermobanen , (Oslo)-Eidsvoll	302	365	
6. Østfold	Østfoldbanen , vestre og østre linje, Vestre linje, (Oslo)-(Kornsjø), Østre linje, (Ski)-(Sarpsborg)	245	307	Follobanen inngår når den åpnes i 2022
7. Oslo	Hovedbanen , (Oslo)-(Lillestrøm), Drammensbanen , Oslo-(Drammen), Askerbanen , Lysaker-Asker, Spikkestadbanen , (Asker)-Spikkestad, Gjøvikbanen , (Oslo)-Gjøvik	252	341	Inkl. Alnabru, Alnalinja, Lodalen, Loenga og godssporet Loenga-Alnabru

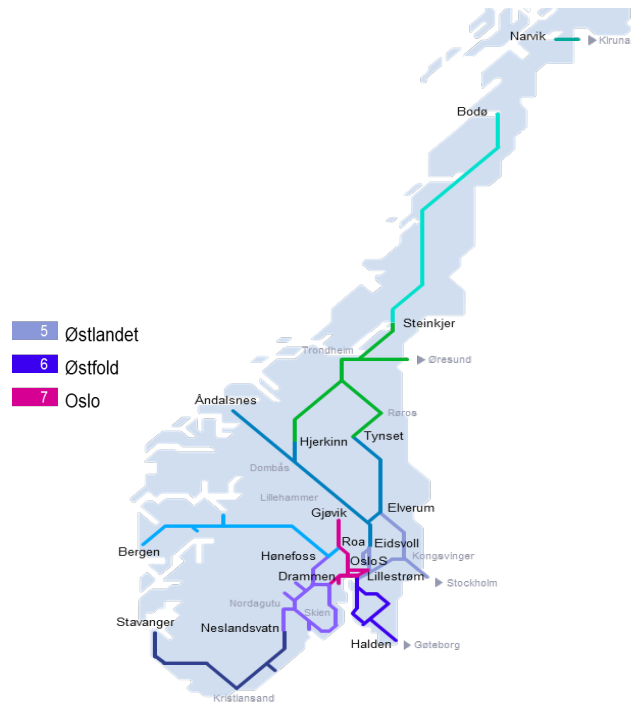

Prosjekt

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Sporfornyelse Lodalen	1:1 bytte av sporveksler i Lodalen. Bytte av 5-7 enkle sporveksler, noe sville, skinne- og massebytte i tilhørende spor.	NS 8406	Q4/2019	Q2/2020	Q4/2020
Forberedende renseverk Drammenbanen	Omlegging av rørkryssinger, kummer etc. Rensk og etablering av linjegrøfter. Stikkrenner. Vegetasjon.	NS 8406	Q4/2019	Q2/2020	Q4/2020
Fornyelse kontaktledningsanlegg Drammenbanen, Slependsen-Asker	Nytt kontaktledningsanlegg på 7,5 km dobbeltspor	NS 8405	Q4/2019	Q2/2020	Q4/2020

Prosjekt

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Ny Hovedtavle, H2 Nationalteatret stasjon, Drammenbanen	Ny hovedfordelingstavle (10-12) felter. Bygging av nytt tavlerom på ny lokasjon. UPS anlegg og kabelarbeider.	NS 8407	Q1/2020	Q1/2020	Q4/2020
Strømforsyning til sporvekselvarmeanlegg Loenga, Oslo S	1 stk transformatoriosk 22 kV/230V. Høyspent og lavspent fordeling. Høyspentkabel og føringsveier (ca 500 meter).	NS 8405/07	Q1/2020	Q2/2020	Q4/2020
Togfremføringsforskrift en Grorud verksted-Alna	Reetablering av ca 130m buttspor inkludert ny kontaktledning, nytt HS og DS. Fjerning av ca 225 gammelt meter spor som ikke er i bruk inkludert alle tilhørende objekter	NS 8406	Q1/2020	Q3/2020	Q2/2021

Prosjekt

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Rehabilitering Lieråsen tunnel	Nytt KL-anlegg i tunnelen (dobbeltspor 10,7 km). Montering av nye hengemaster. Montering av nye utligger (cariboni sys-20). Trekking av ny kontaktledning, returledning og AT-kabel.	NS 8405	Q1/2020	Q1/2021	Q4/2021
Fornyelse Lier - Brakerøya	Etablering av nye fundamenter (Dobbeltspor 4,5 km). Ca. 150 mastefundament. Ca. 30 fundamenter for barduner.	NS 8406	Q4/2019	Q1/2020	Q1/2021
Fornyelse Lier - Brakerøya	Nytt KL-anlegg (dobbeltspor 4,5 km). Montering av nye hengemaster. Montering av nye utligger (sys-20). Trekking av ny kontaktledning, returledning og AT-leder.	NS 8405	Q1/2020	Q1/2021	Q4/2021

Kontaktpersoner

Navn

Rune Olsen, prosjektsjef

Kjell Erik Bekkengen, prosjektleder

Eirik Nordseth, prosjektleder

Guna Gunadasan, prosjektleder

Enhet

Prosjekter Oslo II

E-post

olsrun@banenor.no

bekkje@banenor.no


eirik.nordseth@banenor.no

guna.gunadasan@banenor.no

Område Øst - Prosjektenhet III

Enheten har følgende prosjektportefølje i det sentrale Oslo-området

- Alnabru containerterminal.
- Alnabanen
- Hovedbanen Lillestrøm – Oslo S
- Lysaker stasjon, robustiserende tiltak

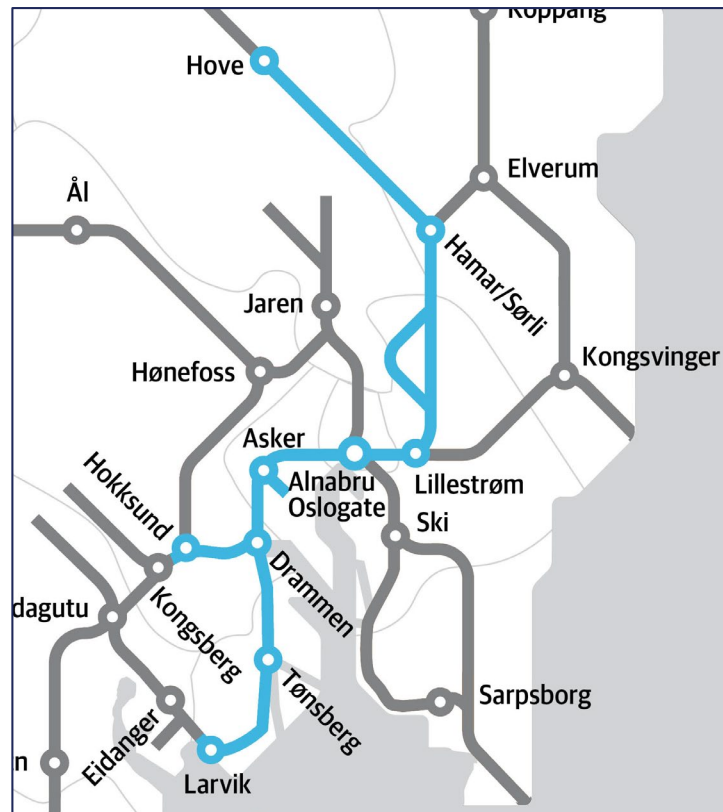

Prosjekt Punktlighetstiltak Fornyelse Etterstad-Lillestrøm

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Sporvekselbytte og signalfornyelse Hovedbanen Etterstad-Lillestrøm	<ul style="list-style-type: none"> • Bytte av 15 stk. sporveksler inkl. drivmaskiner • Fornyelse utvendig signalanlegg (kabler, AS skap) • Signalprosjektering 	NS8407	Q1/2020	Q1/2020	Q4/2021
Fornyelse spor og kontaktledningsanlegg Hovedbanen Etterstad-Lillestrøm	<ul style="list-style-type: none"> • 60 stk. master • 10 stk. sugetransformatorer • Skinne og svillebytte • Rensk av stikkrenner 	NS 8405	Q1/2020	Q1/2020	Q3/2020
22 kV og føringsveier Alna- Etterstad	<ul style="list-style-type: none"> • 6000 m kabelkanaler, kummer, røkrøss • 22 kV høyspenningskabel inkl. nettstasjon 	NS 8405	Q1/2020	Q2/2020	Q1/2021

Prosjekt Alnabru fornyelse og strakstiltak

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Fornyelse av spor og sporveksler	<ul style="list-style-type: none">• 15 stk. sporveksler• 5000 m spor	NS 8405	Q4/ 2019	Q1-2/2020	Q2/ 2021
Utvidelse av lastegate 5 og nye C spor	<ul style="list-style-type: none">• 1300 m nye spor• 6 sporveksler• Nytt KL anlegg (nord)• Utgraving av 40 000 m³ masser• VA anlegg• Endringer i NSI-63 signalanlegg	NS 8405	Q3/2020	Q4/2020	Q1/2022

Prosjekt Robustiserende tiltak Lysaker

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Nytt sporkryss Bærumstunellen (Lysaker)	<ul style="list-style-type: none">Sporkryss og kontaktledning	NS 8405	Q3/2020	Q1-2/2021	Q3/2021

Kontaktpersoner

Navn

Enhet

E-post

Knut-Erik Gudem


Område Øst, Prosjektenhet
III

keg@banenor.no

Område Øst, Prosjektenhet Øst

- Enheten har portefølje i følgende banestrekninger:

KONTRAKTS-OMRÅDE	BANESTREKNINGER	LENGDE (km)	HOVED-SPOR (km)	KOMMENTAR
5. Østlandet	Kongsvingerbanen , (Lillestrøm)-Riksgrensen, Solørbanen , (Kongsvinger)-(Elverum)	203		
6. Østfold	Østfoldbanen , vestre og østre linje, Vestre linje, (Oslo)-(Kornsjø), Østre linje, (Ski)-(Sarpsborg)	245	307	Follobanen inngår når den åpnes i 2022
7. Oslo	Gjøvikbanen , (Oslo)-Gjøvik	124		

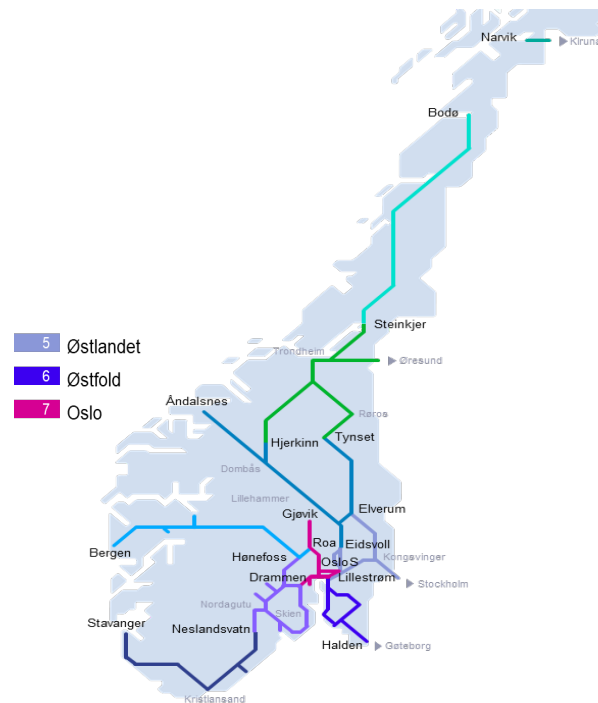

Prosjekt

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Oslo – Ski Underbygning	Utbedring av støttemur Bekkelaget - Ljan	Utførelse entreprise	Q4/2019	Q2/2020	2021
Oslo – Ski Underbygning	Fjellrens Bekkelaget - Hauketo	Utførelse entreprise	Q1/2020	Q2/2020	2020
Mindre Fornyelse Gjøvikbanen	Svillebytte, skinnebytte, sporvekselbytte,	Utførelse entreprise	Q1/2020	Q2/2020	2020

Prosjekt

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Mindre Fornyelse Kongsvingerbanen	Svillebytte, skinnebytte, ballastrens	Utførelse Entreprise	Q1/2020	Q2/2020	2020
Mindre Fornyelse Østfoldbanen	Svillebytte, skinnebytte , nye føringsveier, EI-Kraft fornyelse, signalfornyelse	Utførelse Entreprise	Q1/2020	Q2/2020	2020
Gjøvik Hensetting	Totalentreprise grunnarbeid og jernbanetekniske arbeider ifbm etablering av 2 hensettingspor med 4 hensettingplasser og sideplattform	Utførelse entreprise	Q1/2020	Q2/2020	

Prosjekt

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Kongsvinger Midlertidig Hensetting	Signalarbeider	Utførelse entreprise	Q1/2020	Q2/2021	2020
Underbygningsarbeider Kongsvingerbanen, Østfoldbanen, Gjøvikbanen	Drenering og stikkrenner massebytte på Blaker og Askim	Utførelse Entreprise	Q2/2020	Q2/2020	2020
Bytte av sporveksler	4 stk. Vestby Nord og spv 35 Kongsvinger	Utførelse entreprise	Q1/2020	Q2/2020	2020

Prosjekt

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Investering – planoverganger i Øst	Prosjektering og nedlegging av planoverganger	Utførelse entreprise	Q2/2020	Q2/2020	2020

Kontaktpersoner

Navn

Enhet

E-post

Åge Knutsen

Område Øst,
Prosjektenheten

Age.knutsen@banenor.no

Lars Berge

Område Øst
Områdedirektør

Lars.berge@banenor.no
